

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ)»

Разработчики проекта:

заместитель директора по УВР Плотникова Л.П., заместитель
директора по ВР Устюжанина С.А., учитель труда (технологии)
Виноградова Л.А.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса организации практических работ по труду (технологии)»

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Карповская СОШ»
 Т.А. Синцова
 « » 2024г.



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — учитель труда (технологии)
Периметр проекта — кабинет труда (технологии)
Владелец процесса — директор МБОУ «Карповская СОШ» Синцова Т.А.
Руководитель проекта — учитель Виноградова Л.А.
Команда проекта — заместитель директора по УВР Плотникова Л.П., заместитель директора по ВР Устюжанина С.А., учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
Начало процесса – 02.09.2024 г.
Конец процесса – 22.11.2024 г.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — невыполнение СанПиН по продолжительности НОД. Нарушение последующих режимных моментов.
Проблемы:

1. Длительный поиск материалов для занятия
2. Большие потери времени при раскладывании оборудования на рабочие столы
3. Ошибки при раскладывании оборудования
4. Лишние перемещения
5. Потеря времени в момент уборки оборудования

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени на подготовку к занятию	15 мин	8 мин
2. Сокращение времени уборки оборудования для практических работ	13 мин	9 мин.
3. Сокращение количества перемещений при подготовке к практической работе и уборке нужного оборудования	103 шага	31 шаг
4. Сокращение количества ошибок при подготовке к практической работе	5-7 ошибок	0 ошибок

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 02.09.2024г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 02.09.-15.09.2024г.
 - разработка карты текущего состояния — 16.09-22.09.2024
 - разработка карты целевого состояния — 23.09.-29.09.2024
3. Внедрение улучшений — 30.09-31.10.2024г.
 - совещание по защите подходов внедрения — 08.11.2024
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 11.11.-21.11.2024г.
 - завершающее совещание-22.11.2024г.

Руководитель проекта

Л.А. Виноградова

Зачетную работу выполнили: заместитель директора по УВР Плотникова Л.П., заместитель директора по ВР Устюжанина С.А., учитель технологии Виноградова Л.А.

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ТРУДА (ТЕХНОЛОГИИ) К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ»




ВВП = 55,5 минут

Проблемы процесса:

- 1 — Необходимость составления перечня оборудования для практической работы.
- 2 — Лишние движения и перемещения при подборе оборудования.
- 3 — Наличие неисправного для использования оборудования.
- 4 — Большие затраты времени на подготовку оборудования.
- 5 — Излишние запасы оборудования/ Недостаток оборудования.
- 6 — Ожидание, пролеживание оборудования.
- 7 — Лишняя транспортировка.

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ТРУДА (ТЕХНОЛОГИИ) К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ»

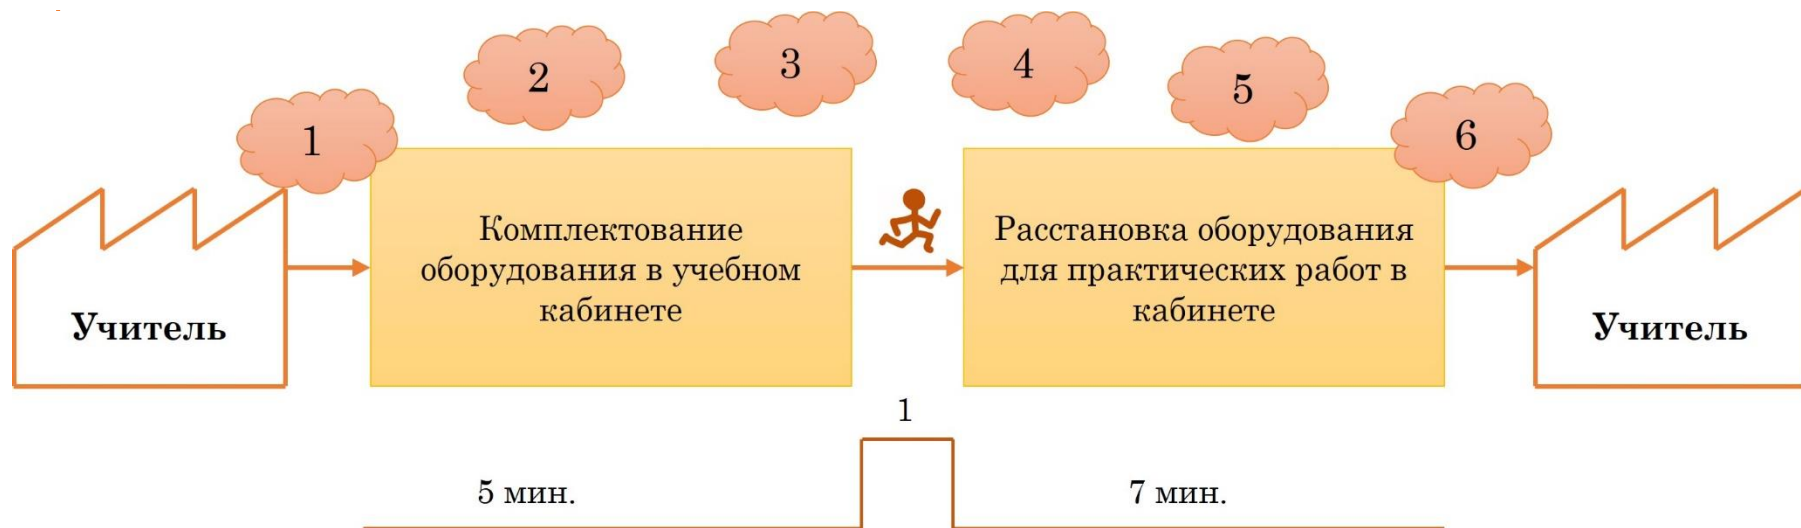

Время протекания процесса (ВПП) = 13 минут 0,22 часа)

Способы решения проблем:

- 1 — Составление стандарта комплектования оборудования для практической работы.
- 2 — Создание перечня оборудования с привязкой к местам хранения.
- 3 — Составление стандарта подготовки оборудования для практической работы.
- 4 — Контроль работоспособности оборудования для практической работы.
- 5 — Подготовка стандарта по расстановке оборудования для практической работы.
- 6 — Привлечение дежурных к расстановке оборудования для практической работы в классе (при наличии согласия родителей).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем в деятельности образовательной организации	02.09.2024 г. 02.09-15.09.2024 г.	Сформирована команда проекта	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
2	Анализ текущего состояния процесса подготовки к практической работе	16.09.-22.09.2024 г	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
3	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем	23.09.-29.09.2024 г.	Карта целевого состояния План мероприятий	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
4	Внедрение улучшений: Составление стандарта комплектования оборудования для практической работы. Создание перечня оборудования с привязкой к местам хранения. Составление стандарта подготовки оборудования для практический работ. Контроль работоспособности оборудования для практический работ. Подготовка стандарта по расстановке оборудования для практический работ. Привлечение дежурных к расстановке оборудования для практический работ в классе (при наличии согласия родителей).	30.09-31.10.2024 г.	Создание перечня оборудования с привязкой к местам хранения.	Заместитель директора по УВР Плотникова Л.П., заместитель директора по ВР Устюжанина С.А., учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
5	Совещание по защите	08.11.2024 г.	Принятие результатов и внесение поправок	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.
6	Закрепление результатов и закрытие проекта	11.11.-21.11.2024 г.	Процесс организации практических работ по труду (технологии) оптимизирован	Учитель труда (технологии) Виноградова Л.А.

ФОТО «ДО И ПОСЛЕ»

- Из библиотеки мы взяли ненужную тумбочку из под картотеки.
- Разработали список названий необходимого оборудования. Распечатали, выстригли и заламинировали.
- Разложили в алфавитном порядке в кармашки ящика.



ФОТО «ДО И ПОСЛЕ»

- Дно выдвигающихся ящиков было открытым.
- Из фанеры вырезали нужного размера подложку.



ФОТО «ДО И ПОСЛЕ»

- Разложили все необходимые материалы и инструменты по ящичкам.

